

Beheercomité Saneringsverbond:

Grondhopen

22/06/2023

Spoor:

Sanering: Veiligheidsmaatregelen
Oosterweel

Status informatie:

Stand van zaken

Onderwerp:

Stand van zaken 'Grondhopen en
advies Auditeur Raad van State

Contactgegevens:

Info@lantis.be

Beheercomité Saneringsverbond:

Grondhopen

Context:

In het auditoraatverslag van de Raad van State (A. 235.867/VII-41.332 V-12-APR, dateert van 28 april 2023) een verniegiging voorstelt van de conformverklaring van de technische verslagen van maart 2022.

Tijdens een bilateraal overleg geeft Lantis een uitgebreide toelichting over de gestelde vragen rond dit auditoraatverslag.



Stand van zaken 'Grondhopen & advies Auditeur RvState'

Overleg BBL 22 juni 2023



Vragen BBL

i.v.m. de geschorste technische verslagen

- Zijn deze technische verslagen nog in gebruik voor de werfzone? Met andere woorden: is er nog een voorwerp in deze RvS-procedure?
- Welke technische verslagen worden er nu gebruikt voor de lopende en toekomstige grondwerkzaamheden en hoe verschillen die van de eerdere?
- Hebben die nieuwe technische verslagen oplossingen op de bezwaren van de eerste auditeur (met name: de kadastrale werkzone, de normering en de stockage van PFAS-verontreinigde gronden die als afval moeten beschouwd worden). *(Eventueel kan dit in een tabelvorm worden toegelicht: de verschillen tussen de technische verslagen & de antwoorden op de bezwaren van de auditeur)*
- Meer beleidsmatig: wat betekent dit verslag voor het Vlaamse beleid (VLAREBO, definitie kadastrale werkzone, werking Grondbank/OVAM etc...)?
- Vraag om in alle transparantie de technische verslagen te delen met het beheercomité

Zijn de technische verslagen nog in gebruik

Grondstocks en grondverzet uitgevoerd voor schorsing vallen nog onder de geschorste TV's

- Opvolging stocks 3-47 $\mu\text{g}/\text{kg}$ PFAS conform regels Grondbank. Maandelijks overzicht naar Grondbank/OVAM afd toezicht. Driemaandelijks overleg ter plaatse.

Geen bijkomende grondverzet (met/zonder PFAS) onder deze TV's na schorsing

- Nieuw ontgraven gronden met PFAS \rightarrow afvoer naar CGR of externe TOP
- Grondverzet met niet-PFAS houdende gronden via beperkt TV

Heeft procedure RvState nog voorwerp

Grondhopen/grondverzet onder geschorste TV's worden nog gedekt door deze TV's.

Bij vernietiging/intrekking wordt integrale uitvoering routeplan onmogelijk

- Impact afvoer milieukost
- Toepassing gronden onder afdek
- Toepassing teelaarde van licht verontreinigde gronden
- Vervuiler betaalt niet

Remediëringspistes (in onderzoek)

- Uitgebreid TV onder Tijdelijk Handelingskader (uitloog ? Model ? timing ??)
- Inkanteling in BBO/BSP (timing ??)
- Afvoer voor reiniging/storten (capaciteit??)

-> beslissing te nemen RvB juli 2023

Welke technische verslagen worden er nu gebruikt hoe verschillen die van de eerdere?

Beperkte TV's voor herbruik propere gronden

- Geen herbruikcode voor gronden met PFAS > WVG (900) -> afvalstatuut -> afvoer beperkte hoeveelheden naar CGR/TOP
- Opdeling in beperkte Kadastrale Werkzones

Momenteel aanpassing aan Sitebesluit

Hebben die nieuwe technische verslagen oplossingen op de bezwaren van de eerste auditeur

Bemerkingen Auditoraat	Beperkte Technische Verslagen
Kadastrale werkzone over 2 apart vergunde projectonderdelen	KWZ per (deel van) vergund projectonderdeel
Het gehanteerde toetsingskader is onwettig (opdeling KWZ's in subzones)	Geen gebruik of opslag van gronden op site > WVG PFAS
Geen bijkomende verontreiniging van het grondwater	Geen gebruik of opslag van gronden op site > WVG PFAS
Stockage PFAS verontreinigde gronden die als afval dienen te worden beschouwd	Geen gebruik of opslag van gronden op site > WVG PFAS

Wat betekent dit verslag voor het Vlaamse beleid (VLAREBO, definitie kadastrale werkzone, werking Grondbank/OVAM etc...)?

Niet aan Lantis om te beoordelen

Vraag om in alle transparantie de technische verslagen te delen

Projectgebied Infrastructuur Linkeroever (ILO)

- TV K03
- TV K04
- TV KSB06
- TV Retentiebekken 5
- TV Afrit S2P (verbinding KT naar Parallelweg):
- TV Grondwerk S32 (vervanging Veenlaag):
- TV Retentiebekken 3A
- TV Retentiebekken 6

Vraag om in alle transparantie de technische verslagen te delen

Projectgebied Scheldetunnel (ST)

- TV Diepwanden RO
- TV Bouwkuip BK1
- TV Bouwkuip BK2
- TV Cut&Cover ST RO


Momenteel aanpassing aan Sitebesluit

Routeplan Grondverzet

- Ontgraving gronden > WVG natuurzone werfgebied : gepland
- Afvoer gronden > 47 $\mu\text{g}/\text{kg}$ PFAS grondhopen afgevoerd
- Toepassing gronden 3 – 47 $\mu\text{g}/\text{kg}$ PFAS in veilige bermen met afdek :
 - Realisatie nog onduidelijk
 - Weinig ruimte in THK
 - Evt via BBO/BSP

Traject BBO/BSP

- BBO Zwijndrecht : conform verklaard 31/5/2023 (3M)
- BBO Ecotox : ingediend 1/6/2023 (3M)
- BBO Linkeroever : ingediend 1/6/2023 (3M)
- BBO KAW : ingediend 16/6/2023 (Lantis)

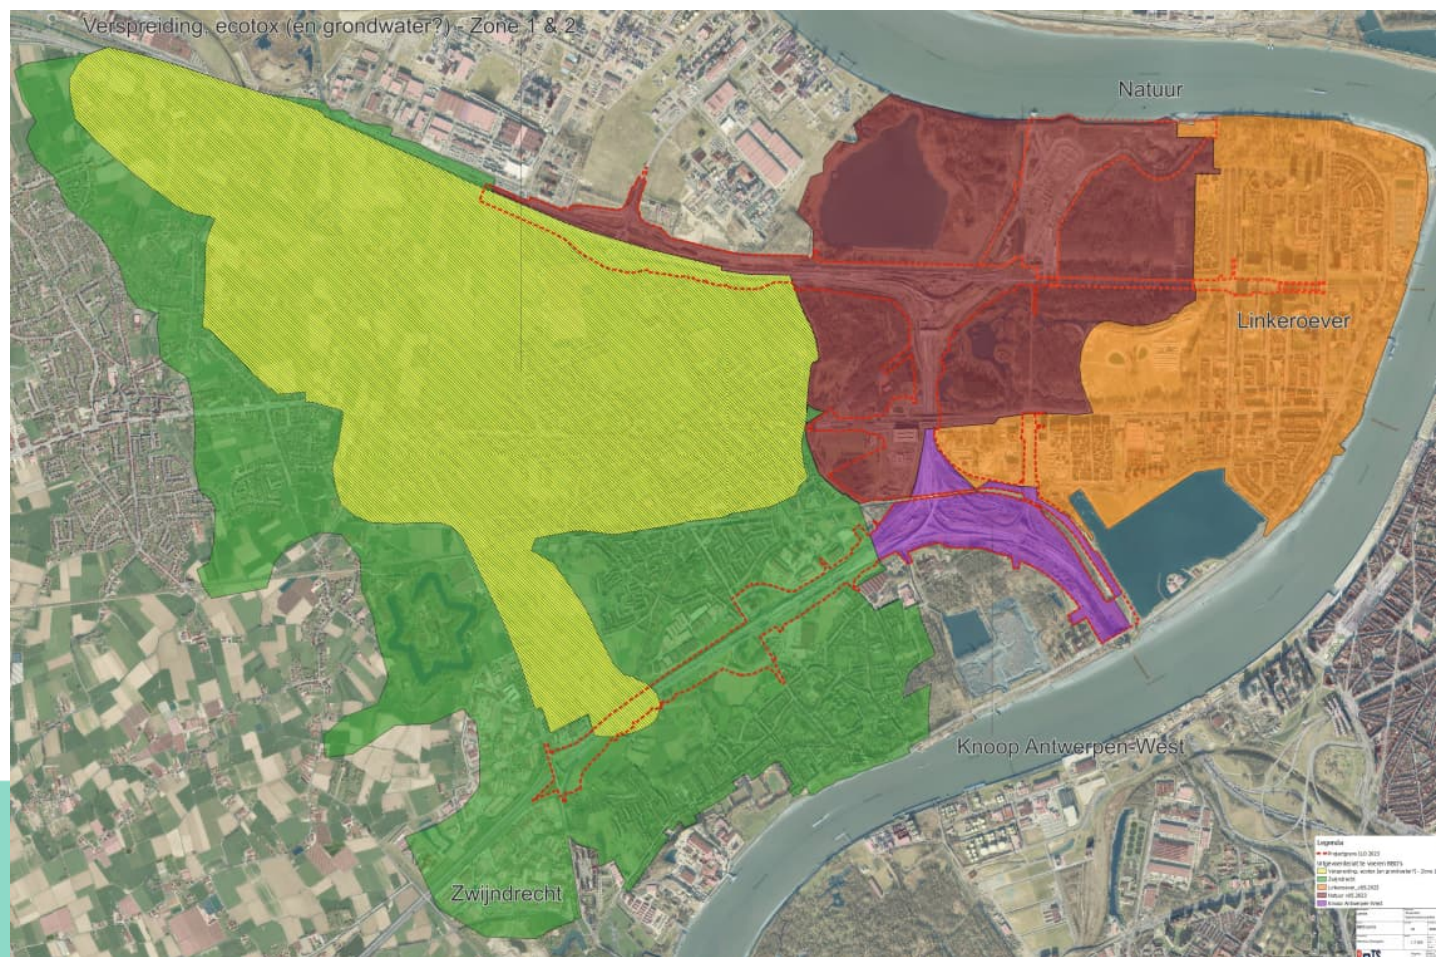

Traject BBO/BSP

BSP Zone 1A : conform (3M)

BSP Zwijndrecht : verantwoordelijkheid 3M

Zone Ecotox : Timing en taakverdeling : in bespreking

- BSP Ecocorridor Palingbeek (3M/Lantis)
- BSP Werfzone Lantis (3M/Lantis)
- BSP Natuurgebieden (3M)

BSP KAW : geen saneringsnoodzaak evt vrijwillige sanering ter
verwezenlijking Routeplan (Lantis)

Feedback Lantis - Beheercomité

- Stand van zaken Routeplan, 17 januari 2023 (bemalingstechnieken, WZI, afvoer gronden > 47 µg/kg, grondverzetpraktijk, synergie grondverzet – sanering, innovatieve technieken)
- Stand van zaken Grondhopen, 13 februari 2023 (afvoer gronden > 47 µg/kg en nieuw ontgraven gronden PFAS, beheer grondstocks)
- Stand van zaken, 13 maart 2023 (saneringstraject, WZI's, Blokkersdijk, afvoer veiligheidsberm)
- Antwoorden op vragen BBL, 15 juni 2023 (grondhopen, advies auditeur)
